Id	Opgavetilst	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1		Forberedelse	12 dage	on 15-04-20	to 30-04-20
2		Beslutning på Kultur og fritidsudvalgsmøde	1 dag	on 15-04-20	on 15-04-20
3		Beslutning i Byråd	1 dag	to 30-04-20	to 30-04-20
4		Udarbejdelse af Udbudsmateriale	41 dage	ma 04-05-20	to 02-07-20
5		A. Udbudsbrev	1 dag	ma 04-05-20	ma 04-05-20
6		B. Konkurrencebetingelser	3 uger	ti 05-05-20	on 27-05-20
7		C. Kontraktudkast	1 uge	to 28-05-20	to 04-06-20
8		D. Tilbudsliste	1 uge	fr 05-06-20	to 11-06-20
9		E. Byggeprogram	5 uger	to 28-05-20	to 02-07-20
10		F. Fællesbetingelser	5 uger	to 28-05-20	to 02-07-20
11		G. Bilag	5 uger	to 28-05-20	to 02-07-20
12		Godkendelse af udbudsmateriale	17 dage	fr 03-07-20	ma 17-08-20
13		Materiale til gennemsyn	10 dage	fr 03-07-20	to 06-08-20
14		Bygherremøde - gennemgang af evt. rettelser	1 dag	fr 07-08-20	fr 07-08-20
15		Tilretning	5 dage	ma 10-08-20	fr 14-08-20
16		Godkendt udbudsmateriale	1 dag	ma 17-08-20	ma 17-08-20
17					
18		EU udbud	33 dage	to 20-08-20	ma 05-10-20
19		Prækvalifikation	33 dage	to 20-08-20	ma 05-10-20
20		Annoncering	1 dag	to 20-08-20	to 20-08-20
21		Ansøgningsperiode Prækvalifikation	23 dage	fr 21-08-20	ti 22-09-20
22		Frist for anmodning om prækvalifikation	0 dage	on 23-09-20	on 23-09-20
23		Gennemgang af ansøgninger	5 dage	on 23-09-20	ti 29-09-20
24		Udarbejdelse af indstilling	2 dage	on 30-09-20	to 01-10-20
25		Bygherremøde - gennemgang af indsti	1 dag	fr 02-10-20	fr 02-10-20
26		Godkendelse af indstilling	0 dage	ma 05-10-20	ma 05-10-20
27		Besked til ansøgerne om prækvalifikat	1 dag	ma 05-10-20	ma 05-10-20
28		Indledende tilbud	42 dage	ti 06-10-20	on 02-12-20
29		Tilbudsperiode - Indledende tilbud	30 dage	ti 06-10-20	ma 16-11-20
30		Frist for aflevering af indledende tilbud	0 dage	ti 17-11-20	ti 17-11-20
31		Gennemgang af indledende tilbud	10 dage	ti 17-11-20	ma 30-11-20
32		Bygherremøde - evaluering af indledende tilbud	1 dag	ti 01-12-20	ti 01-12-20
33		Udsendelse af brev med emner til forhandling	1 dag	on 02-12-20	on 02-12-20
34		Forhandling	12 dage	ti 15-12-20	ma 04-01-21
35		Forhandlingsmøder	3 dage	ti 15-12-20	to 17-12-20
36		Forhandlingsmøde - team 1	1 dag	ti 15-12-20	ti 15-12-20
37		Forhandlingsmøde - team 2	1 dag	on 16-12-20	on 16-12-20
38		Forhandlingsmøde - team 3	1 dag	to 17-12-20	to 17-12-20
39		Bygherremøde - opsamling i forhold til evt. rettelsesblad på tværs af forhandlingsmøderne	1 dag	ti 22-12-20	ti 22-12-20
40		Udarbejdelse af rettelsesbrev/opdatering af udbudsmateriale	5 dage	on 23-12-20	to 31-12-20
41		Udsendelse af evt. rettelsesbrev/opdateret udbudsmateriale	1 dag	ma 04-01-21	ma 04-01-21
42		Endelige tilbud	32 dage	ti 05-01-21	on 17-02-21
43		Tilbudsperiode - endelige tilbud	20 dage	ti 05-01-21	ma 01-02-21
44		Frist for aflevering af endeligt tilbud	0 dage	ti 02-02-21	ti 02-02-21
45		Gennemgang af endelige tilbud	10 dage	ti 02-02-21	ma 15-02-21
46		Bygherremøde - evaluering af endeligt tilbud	1 dag	ti 16-02-21	ti 16-02-21
47		Evt. politisk godkendelse	1 dag	on 17-02-21	on 17-02-21
48		Kontrahering	15 dage	to 18-02-21	on 10-03-21
49		Samtidig meddelelse til de bydende	1 dag	to 18-02-21	to 18-02-21
50		Standstill	9 dage	fr 19-02-21	on 03-03-21
51		Kontrahering af totalentreprenør	5 dage	to 04-03-21	on 10-03-21
52					
53		Udførelse af byggeri	570 dage	to 11-03-21	ma 14-08-23
54		Mobilisering	4 uger	to 11-03-21	fr 09-04-21
55		Projektering	200 dage	ma 12-04-21	to 10-02-22
56		Dispositionsforslag	4 uger	ma 12-04-21	ma 10-05-21
57		Granskning Dispositionsforslag	2 uger	ti 11-05-21	on 26-05-21
58		Projektforslag	8 uger	to 27-05-21	on 11-08-21
59		Granskning Projektforslag	2 uger	to 12-08-21	on 25-08-21
60		Forprojekt	8 uger	to 26-08-21	on 20-10-21
61		Granskning forprojekt	2 uger	to 21-10-21	on 03-11-21
62		Hovedprojekt	12 uger	to 04-11-21	to 27-01-22
63		Granskning Hovedprojekt	2 uger	fr 28-01-22	to 10-02-22
64		Myndighedsbehandling	8 uger	to 21-10-21	on 15-12-21
65		Byggefase	78 uger	to 16-12-21	ma 14-08-23
66					
67		Aflevering	17 dage	ti 15-08-23	on 06-09-23
68		Før afevering	1 uge	ti 15-08-23	ma 21-08-23
69		Testperiode	3 uger	ti 15-08-23	ma 04-09-23
70		Mangelafhjælpning	3 uger	ti 15-08-23	ma 04-09-23
71		Aflevering.	2 dage	ti 05-09-23	on 06-09-23
72					
73		Drift	1 dag	on 13-09-23	to 14-09-23
74		Indvielse	1 dag	on 13-09-23	on 13-09-23
75		Drift	0 dage	to 14-09-23	to 14-09-23
76					

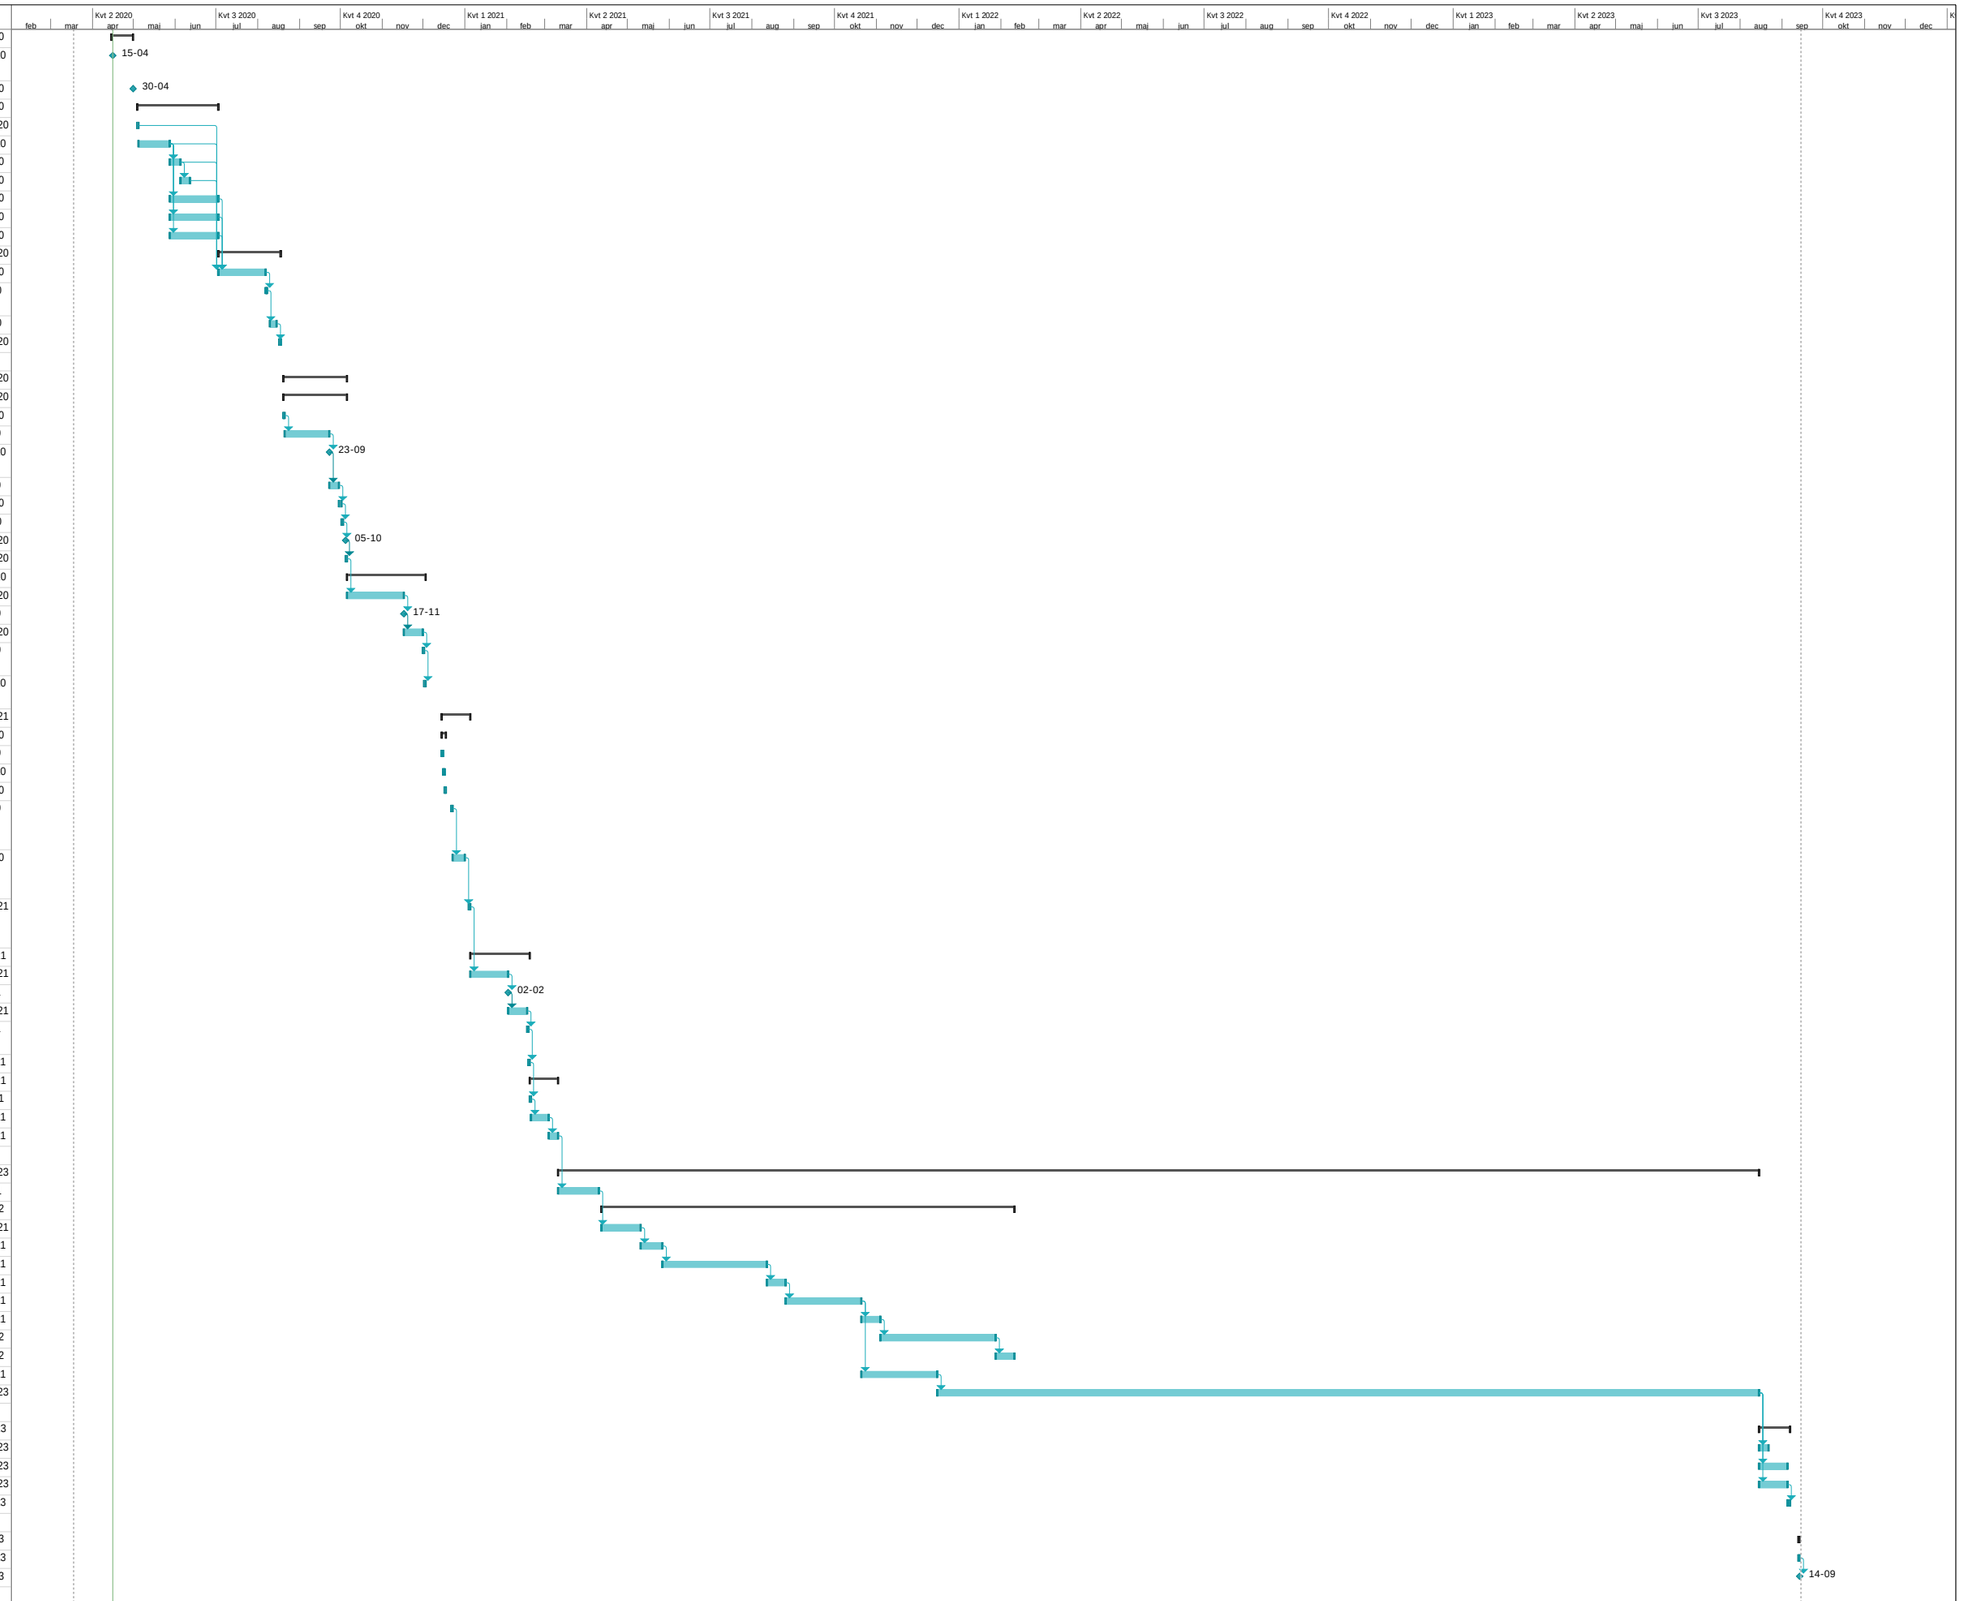

Projekt: Aars Svømmecenter - åben konkurrence i to faser
Dato: to 16-04-20

Opgave · Opdeling · Milepæl · Hovedopgave · Projektoversigt · Inaktiv opgave · Inaktiv milepæl · Inaktiv oversigt · Manuel opgave · Kun varighed · Manuel oversigtsopløftning · Manuel oversigt · Kun start · Kun slutdato · Eksterne opgaver · Ekstern milepæl · Deadline · Fremdrift · Manuel status
